


RESUMEN DEL SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2026

AVANCE FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

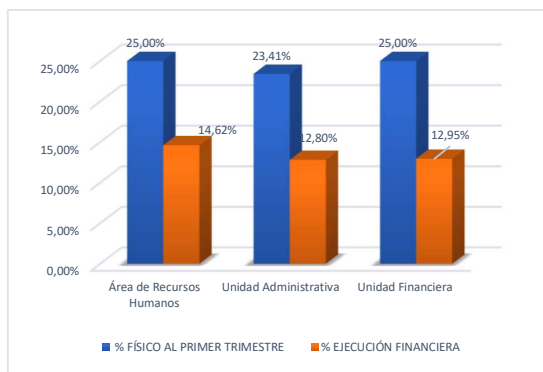

La Dirección de Administración y Finanzas con sus unidades operativas, pudo lograr un **avance físico** del **24,07%**, y una ejecución presupuestaria del **14,34%** (aquellas actividades que alcanzaron el 100% de ejecución durante el trimestre fueron ajustadas al 25% en el reporte, dado que dicho valor representa el cumplimiento de la meta trimestral programada).


Unidad Financiera

Durante el primer trimestre de 2026, la Unidad Financiera llevó a cabo diversas actividades clave, entre las que destacan: la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la gestión 2025, la ejecución de conciliaciones bancarias y el registro del libro de compras y ventas ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

Unidad Administrativa - Sistemas

Durante el primer trimestre, el área de Sistemas atendió 323 solicitudes de soporte y mantenimiento de equipos de comunicación, 11 respaldos de información Backups y se realizaron 19 intervenciones sobre sistemas de la AISEM (mantenimiento, generación de reportes, publicaciones, correcciones etc).

AVANCE FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

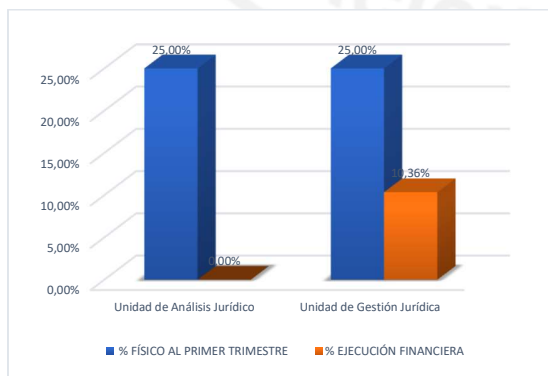

El **avance físico** de la **Dirección de Asuntos Jurídicos** al Primer Trimestre alcanza el **25,00%** respecto a lo programado en el POA, y una ejecución presupuestaria del **10,36%**.


Unidad de Gestión Legal

La Unidad de Gestión Legal, durante el primer trimestre de la gestión 2026, realizó el seguimiento, presentación de memoriales, ingreso a audiencias virtuales y defensa legal.

Unidad de Análisis Jurídico

Durante el primer trimestre se realizó, el asesoramiento jurídico y apoyo en: un (1) contrato modificadorio, una (1) contratación Menor ANPE, dos (2), órdenes de compra, diecinueve (19), contratos de personal eventual, y cincuenta y uno (51) registros de Contratos en el Sistema de la Contraloría General del Estado.

AVANCE FÍSICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

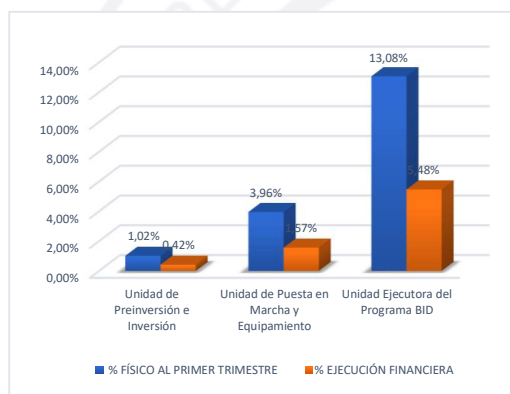

El **avance físico de la Dirección Técnica** alcanzó el **9,04%** que corresponde al promedio de los avances obtenidos de la Unidad de Pre-inversión e Inversión, Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento y la Unidad Ejecutora del Programa BID, presentando una cifra baja en comparación con lo programado al primer trimestre y una ejecución presupuestaria del **2,92%**.

Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento

En cuanto a la programación del primer trimestre, no se contempló ejecución física debido a los plazos inherentes a los procesos de contratación. No obstante, es preciso señalar que factores externos a la AISEM —como demoras en las adecuaciones de infraestructura hospitalaria, la falta de respuesta de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y el consecuente retraso en la remisión de requerimientos de equipamiento— han dificultado el inicio y la conclusión de los procesos de adquisición, en cuanto a equipamiento. Esta situación índice negativamente en el cumplimiento de la planificación del POA 2026 de la Unidad de Puesta en Marcha y Equipamiento."

Unidad de Pre-inversión e Inversión


Al primer trimestre de la gestión 2026, se registraron avances en actividades específicas del POA. Sin embargo, es fundamental señalar los factores críticos que afectaron negativamente la ejecución de los proyectos. Entre estos se encuentran la resolución de contratos con empresas contratistas y la paralización de obras por causas diversas. Asimismo, destaca la necesidad de modificar el DS

N.º 3743 para incrementar el financiamiento y aplicar esta medida a los contratos "Llave en Mano", lo cual permitirá asignar los recursos adicionales necesarios para garantizar la continuidad y conclusión de los proyectos.

A este escenario se suma la coyuntura económica del país, la cual arrastra dificultades desde la gestión 2024 que han impactado de forma directa en los proyectos de inversión pública ejecutados por la AISEM.

AVANCE FÍSICO INSTITUCIONAL


Habiendo realizado el seguimiento físico por Unidad Organizacional de la AISEM, es necesario tener una visión general respecto al avance físico institucional al Primer Trimestre, en este sentido se tiene la siguiente información:

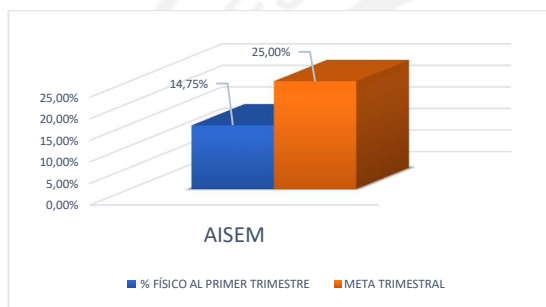

Según lo programado en el POA, la AISEM logró alcanzar **14,75%**, este **avance físico** de acuerdo al grado de cumplimiento está por debajo de lo programado al primer Trimestre, que tiene su mayor efecto debido a las dificultades presentadas en los proyectos de inversión.

AVANCE FINANCIERO INSTITUCIONAL.

En el marco del Informe AISEM/DAF/UF/INF/Nº 00102/26 de fecha 10 de abril del 2026 con referencia "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2026, elaborado por la Unidad Financiera dependiente de la Dirección Administrativa y Finanzas, el cual es también sujeto a seguimiento y evaluación, se presenta la siguiente figura para exponer el avance financiero al Primer Trimestre.

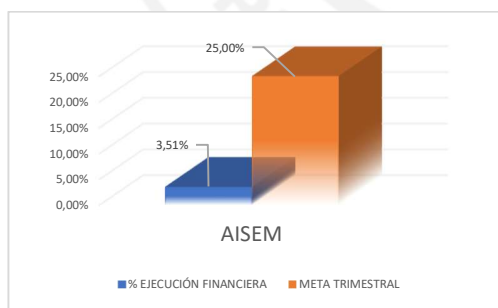

Según los datos proporcionados por el Sistema de Gestión Pública – SIGEP al 31 de marzo del 2026, se tiene una **Ejecución Financiera** de **Bs11.379.853,52** (Once millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta 52/100 bolivianos), que representa el **3,51%** de **avance financiero** a nivel institucional.
